

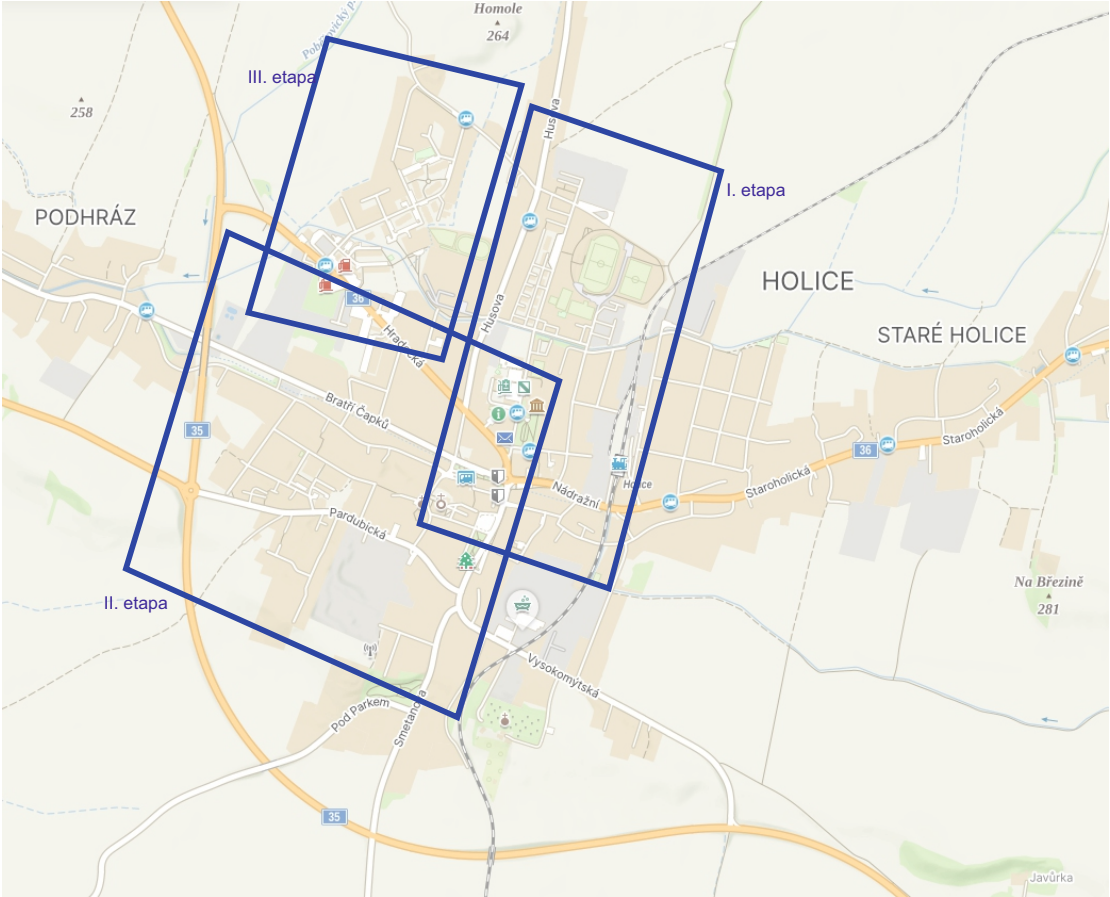


Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025, dle úseků

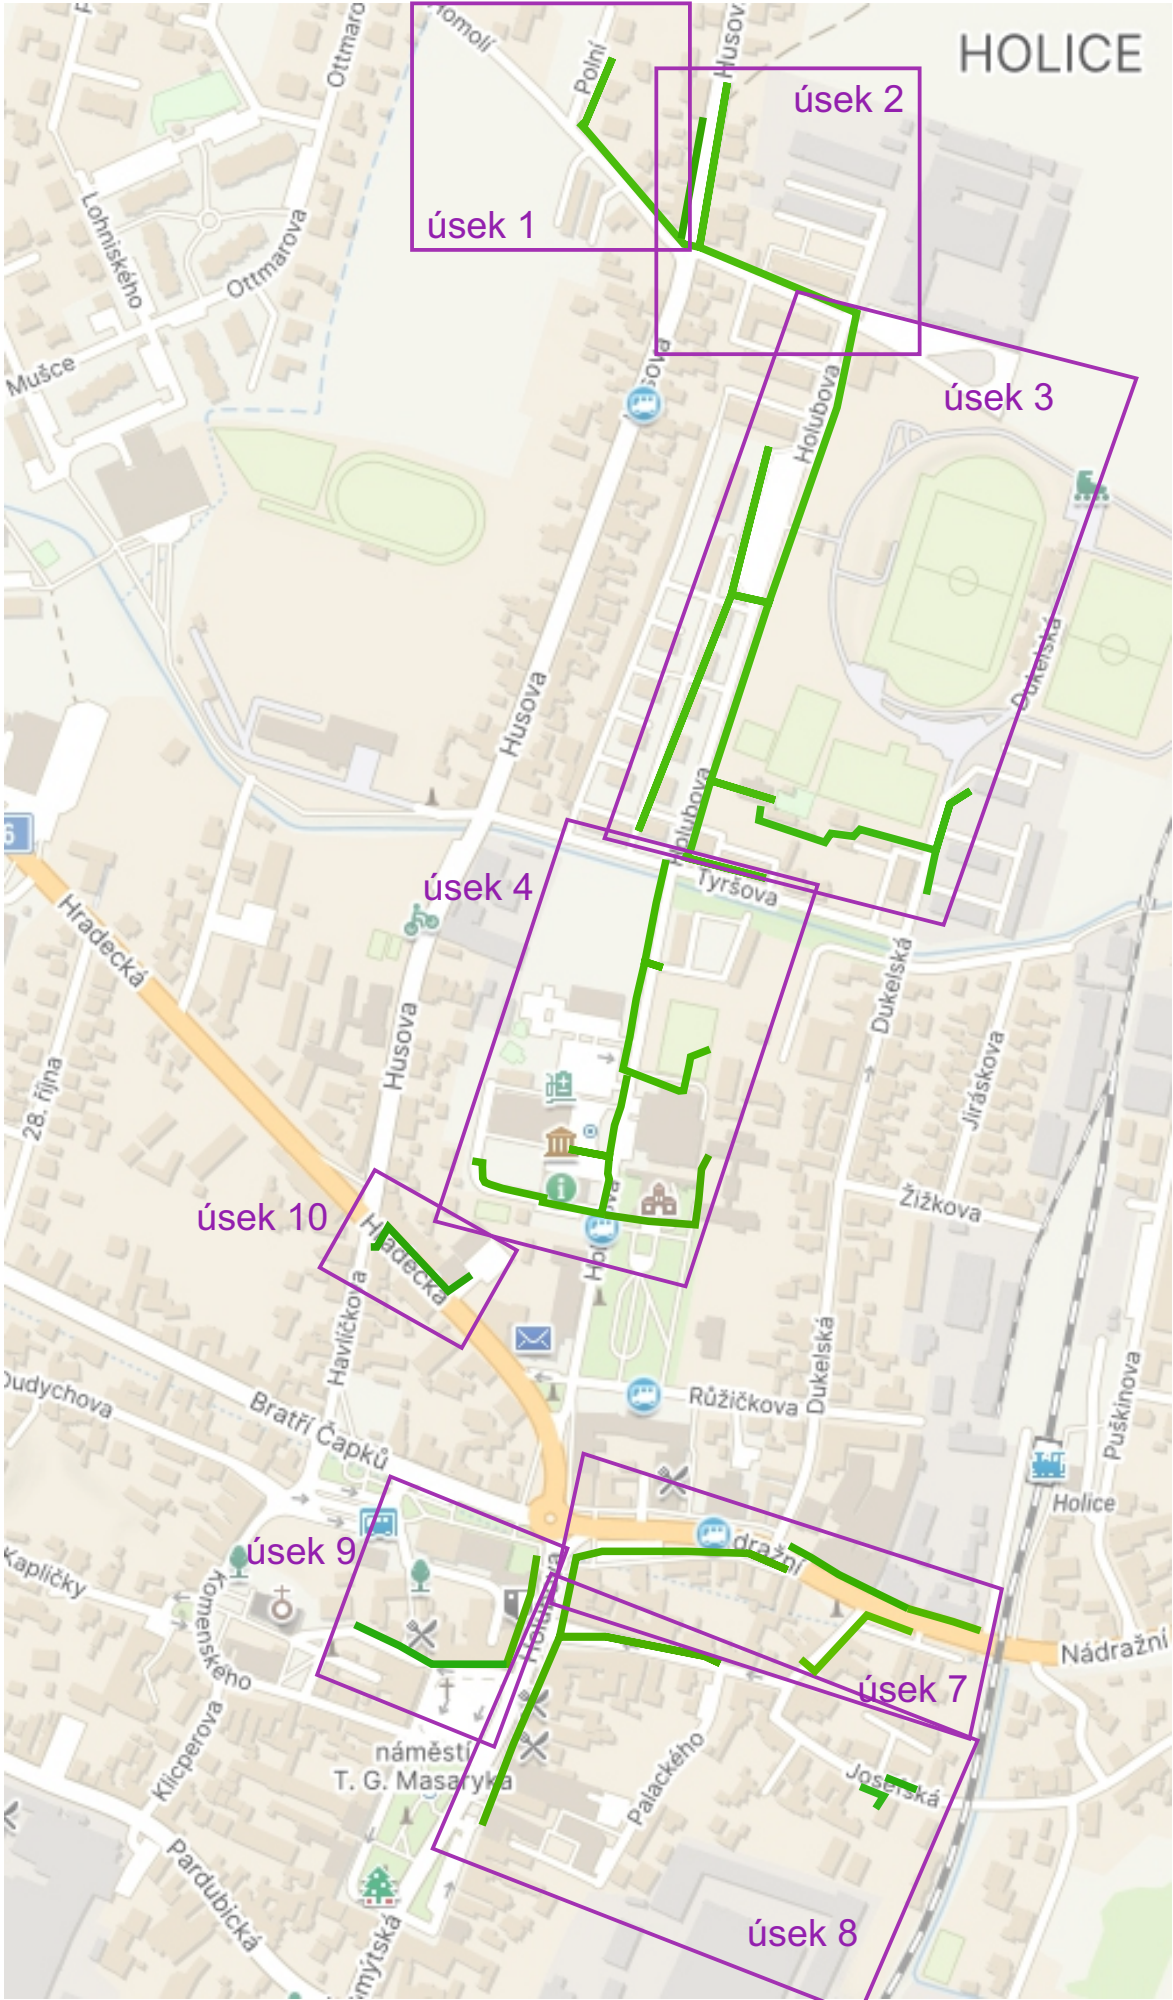

křižovatka T

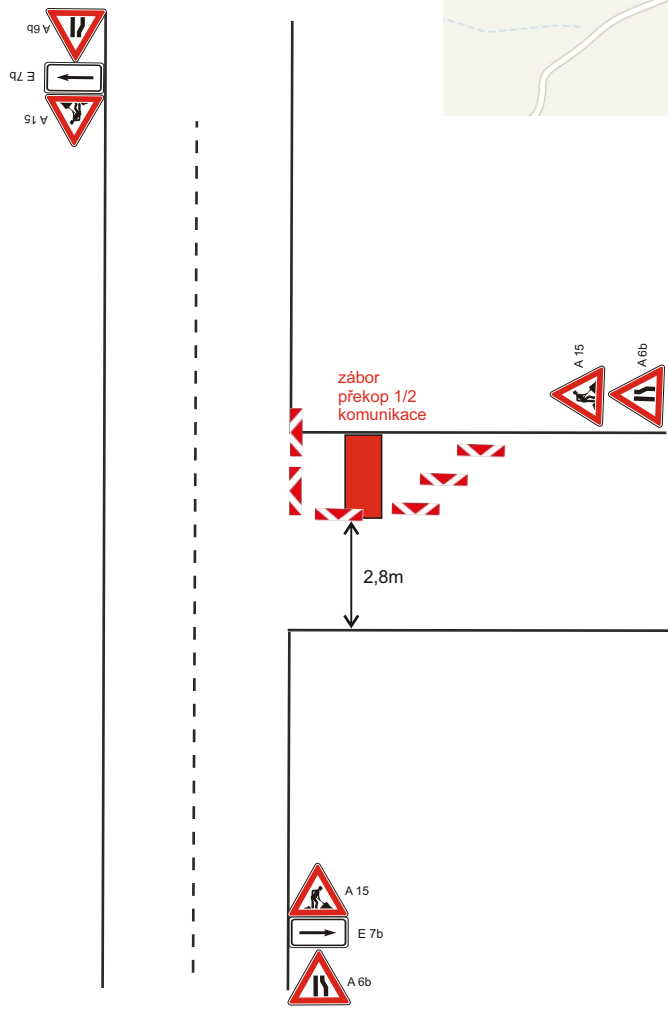

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno. Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

Práce se předpokládají v délce 150 m denně a v co nejmenším zásahu do komunikací a chodníků. Výkopové práce v chodníku do 60 cm, v zeleni do 40 cm. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách.

V místech, kde nebude možný protlak, z důvodu kolize inženýrských sítí, se práce provedou překopem po 1/2 komunikace, ale primární jsou protlaky.

Zhotovitel:							
Kreslil:		Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613					
Zodp. projektant:							
Kontroloval:		David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz					
Kraj: Pardubický		Okres: Holice		Obec: Holice			
Akce:		optické kabely DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ					
DATUM						05.09.2025	
Č.ZAKÁZKY							
STUPEŇ PD						DIO	
MĚŘITKO							
FORMÁT						9xA3	



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 1

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
1.10. - 8.10.2025

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou, možnost přechodových/přejezdových lávek.
DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

celková délka trasy cca 178m

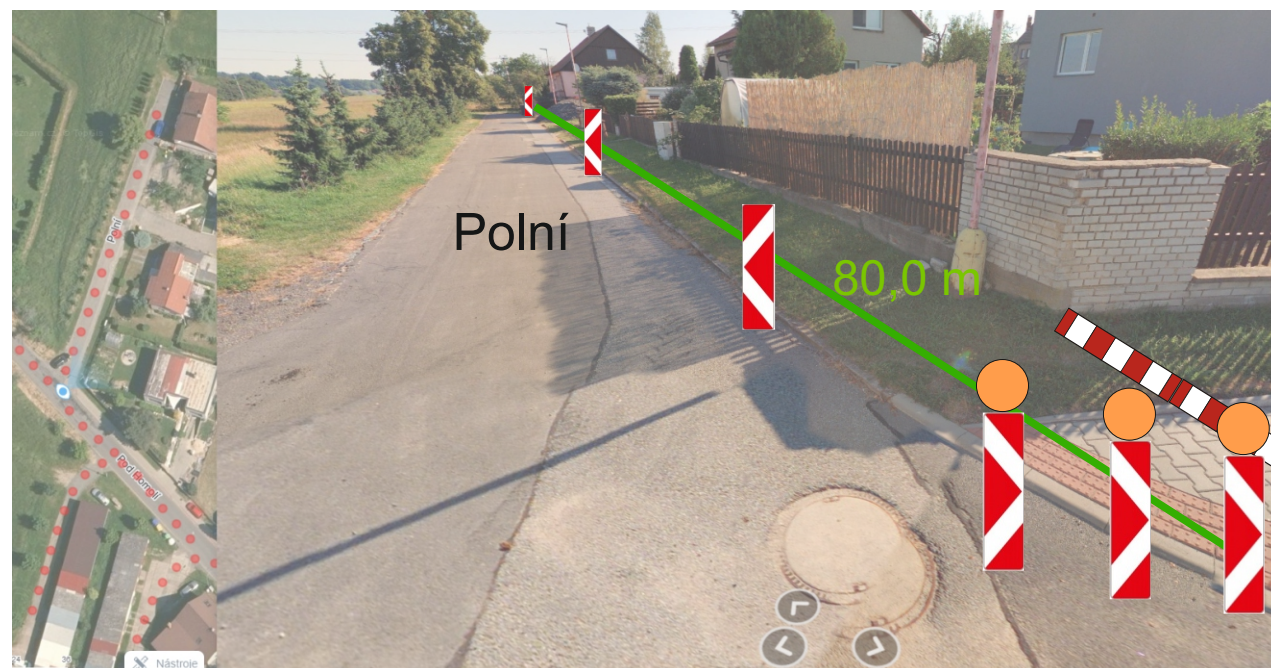

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní před plánovanými pracemi.



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 2

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
8.10 - 18.10.2025

celková délka trasy cca 360m

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou, možnost přechodových/přejezdových lávek.
DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

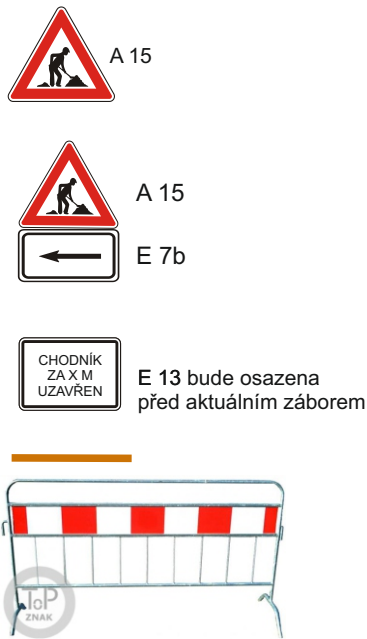

Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.



celková délka trasy cca 1055m




Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
18.10. - 30.10.2025

DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.

Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.




protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do domů a dle
koordinace se stavbou.




CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN
E 13
E 13 bude osazena
před aktuálním záborem



B 28
DATUM
E 13
E 8e

B 28
DATUM
E 13
E 8d


Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.

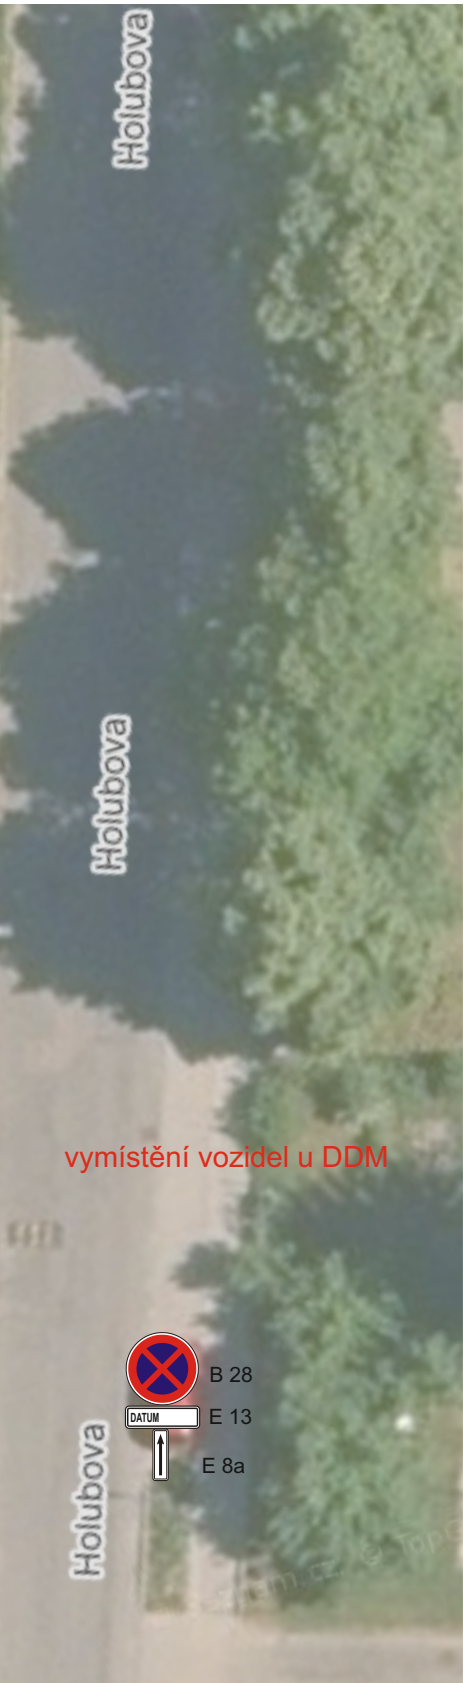

úsek 3

OD 211

pracovní místo



50 - 100

celková délka trasy cca 520m




Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
30.10. - 15.11.2025


DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.

Zábory v zeleni budou
zabezpečeny zábranami.



protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů a dle
koordinace se stavbou.



CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN

E 13 bude osazena
před aktuálním zábořem

úsek 4

OD 211

pracovní místo



50 - 100

Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
15.11. - 30.11.2025


celková délka trasy cca 397m



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




E 13 bude osazena před aktuálním zábořem




protlak

přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.



Vymístění vozidel 7 dní před plánovanými pracemi.



úsek 7

OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
30.11. - 14.12.2025


celková délka trasy cca 500m



úsek 8

CHODNÍK
ZA X M
UZAVŘEN

E 13 bude osazena
před aktuálním záborem



protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů, na chodnících
a dle koordinace se stavbou.

DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemístěno
v závislosti na postupu prací.
Na náměstí T.G.Masaryka a v ul. Holubova
budou zábory chodníku částečné, chodník
je široký, průchozí šíře bude 1,5 m.

Vymístění vozidel 7 dní
před plánovanými pracemi.


B 28

DATUM

2 místa

E 13

E 13

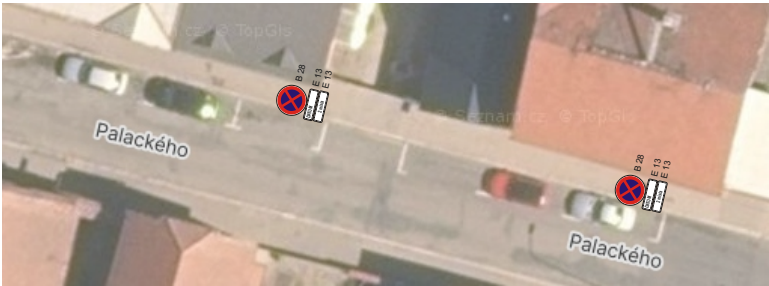

Zřízení optických kabelů Holice

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
14.12. - 20.12.2025

celková délka trasy cca 268m



DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnicích a dle koordinace se stavbou.



E 13 bude osazena před aktuálním záborem



Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.




Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní před plánovanými pracemi.

úsek 9

OD 211

pracovní místo



Zřízení optických kabelů Holice

úsek 10

termín: 1.3. - 30.9.2025, I. etapa, prodloužení 1.10. - 23.12.2025
20.12. - 23.12.2025

celková délka trasy cca 92m




DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.


 protlak

 přechodová/přejezdová lávka bude osazena dle potřeby na vstupech do objektů, na chodnících a dle koordinace se stavbou.

 CHODNÍK ZA X M UZAVŘEN
E 13 bude osazena před aktuálním zábořem

 zábor chodníku

Zábory v zeleni budou zabezpečeny zábranami.




 B 28
 E 13
 E 8a

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní před plánovanými pracemi.

OD 211

pracovní místo



 A 15
50 - 100
